

Import Export

Menu Fichiers

- **Import Export**
- Exporter le KML du projet
- Enregistrer un modèle de projet
- Archiver un projet

L'import et l'export d'activités et de liens se font :

- à travers le presse-papier
- en utilisant si besoin des **profils d'échange**

Les profils d'échanges permettent de conserver une matrice d'association des colonnes de données avec les champs de Phase Manager. Il suffit de charger le bon profil d'échange, de copier-coller vos données dans la fenêtre, et vos données sont traitées !

Les liens ne peuvent pas être mis à jour : le plus simple est de procéder à un import complet des activités et des liens pour recréer ces derniers avec leurs nouvelles propriétés.

Afin de gagner du temps, vous pouvez vous inspirer des profils d'échange et des tables de données types mises à votre disposition : cf. [PMX et sources de données types](#).

Voici un exemple simple d'import d'activités :

Ouvrez le fichier à importer (ici **Projet Demo - V5.xls**), puis sélectionnez et copiez dans le presse-papier l'ensemble des données d'activités **en-tête compris** :


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ID	Parent	Nom	Début	Fin	Calendrier	Zone	Impact	Type impact	Style
2	PM-00001		Phase 2 : 1/4 Giratoire Est			Calendrier 5 jours 8 heures				
3	PM-00001		Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest			Calendrier 5 jours 8 heures				
4	PM-00001		Phase 3b : Aménagement du TPC			Calendrier 5 jours 8 heures				
5	PM-00001		Phase 4 : Chaussée Nord			Calendrier 5 jours 8 heures				
6	PM-00001		Phase 5 : Chaussée Sud			Calendrier 5 jours 8 heures				
7	PM-00001		Phase 6 : Pavage final			Calendrier 5 jours 8 heures				
8	2069	1	Installations et signalisation	17/04/2019 08:00	03/05/2019 12:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone complète			Signalisation
9	2097	1	Démolition bordures et pavés	22/05/2019 08:00	24/05/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Bordures
10	2125	1	Fraisage et dégrappage du bord	25/05/2019 08:00	29/05/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Revêtements
11	2153	1	Elargissement chaussée + fouille	30/05/2019 08:00	01/06/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Chaussée et canalisations
12	2181	1	Services, enrobages et remblays	05/06/2019 08:00	07/06/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Réseaux, remblayages et structure
13	2209	1	Pose de bordures et pavés	08/06/2019 08:00	08/06/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Bordures et pavés
14	2237	1	Réglage terre végétale	11/06/2019 16:00	11/06/2019 16:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Terre végétale
15	2265	1	Fraisage de chaussée	12/06/2019 08:00	13/06/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone complète			Fraisage
16	2293	1	Couche de réglage / planie	14/06/2019 08:00	15/06/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone complète			Planie
17	2321	1	Couche de base 3A (Circulation)	19/06/2019 08:00	22/06/2019 09:55	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone complète			Couche roulement récap jour
18	2349	1	Revêtements trottoir	22/06/2019 09:55	22/06/2019 14:10	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone des trottoirs 1			Revêtements
19	2377	1	Signalisation	22/06/2019 14:10	22/06/2019 15:00	Calendrier 5 jours 8 heures	GirNord : zone complète			Signalisation

Explications :

- 1/ On importe en premier les activités récapitulatives (IDs 2 → 6)
- 2/ On fait référence pour chaque activité à une activité récapitulative, via la colonne "Parent".
- 3/ Chaque activité doit avoir un parent : en l'absence d'activité récapitulative, on mentionne alors le sous-projet (ici PM-00001) qui est donc ici le parent des activités récapitulatives.

Rendez-vous dans le menu **Fichier > Importer activités & Liens**.

Dans la fenêtre d'import qui s'ouvre, insérez les données du presse-papier en cliquant sur le bouton **Coller** :

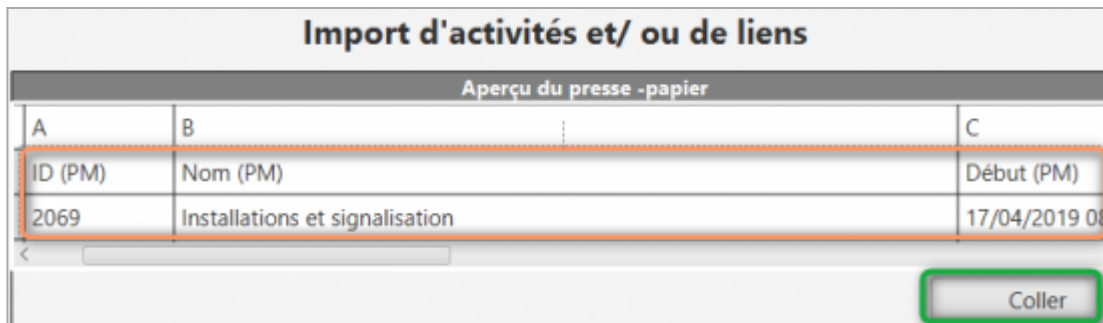


A	B	C
ID (PM)	Nom (PM)	Début (PM)
2069	Installations et signalisation	17/04/2019 01

La zone d'aperçu vous montre que les données ont bien été récupérées. Vous pouvez ensuite associer chaque colonne à un champ de Phase Manager, soit manuellement, soit en important un profil d'échange existant.

Nous allons ici charger le profil Import profileFR.pmx ([livré avec votre installation](#)).

Cliquez sur le bouton **Charger un profil** :



Naviguez ensuite sur votre disque dur pour rechercher le profil d'échange, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Cochez ensuite : *L'entête des colonnes figure dans ma sélection Presse-Papier* :

2	2	PM-00001	Phase 2 : 1/4 Giratoire Est			
---	---	----------	-----------------------------	--	--	--

Nom du profil : ImportActivitesProjetDemo
 ✓ L'entête des colonnes figure dans ma selection Presse-Papier

Format de date : jj/mm/aaaa hh:mm ☐ Ignorer les heures

Activités


☒ Importer des activités

ID	<input type="text" value="ID"/>	Avancement	<input type="text" value="Ignore"/>
ID Parent	<input type="text" value="Parent"/>	Description	<input type="text" value="Ignore"/>
Nom	<input type="text" value="Nom"/>	Quantité	<input type="text" value="Ignore"/>
Calendrier	<input type="text" value="Calendrier"/>	Unité de quantité	<input type="text" value="Ignore"/>
Début	<input type="text" value="Début"/>	Rendement	<input type="text" value="Ignore"/>
Fin	<input type="text" value="Fin"/>	Unité de temps	<input type="text" value="Ignore"/>


Champs additionnels

Nom	Valeur	Impact	Type d'impact	Exécution	Complet	PK de début	PK de fin	En
Zone-1	<input type="text" value="Zone"/>	<input type="text" value="Ignore"/>	<input type="text" value="Ignore"/>					
Style par déf...	<input type="text" value="Style"/>							

On constate que les champs du tableau ont été correctement assignés aux champs Phase Manager correspondants ; vous pouvez cliquer sur le bouton **Importer** en bas à droite de la fenêtre puis confirmez l'importation :


Voulez-vous importer des activités ?
✕

Confirmation



Voulez-vous importer des activités ?

Note sur la fenêtre d'avertissement :

Une fenêtre vous indique que certains champs n'ont pas été importés : c'est informatif, et concerne les champs vides "Zone" et "Dates" pour les activités récapitulatives ; Zone n'ayant pas de sens, et Dates étant héritées des activités filles :

Avertissements !

Les valeurs des champs suivants n'ont pas été importées :

[1,G] [Avertissement]	Incorrect zone value, value ignored.
[2,G] [Avertissement]	Incorrect zone value, value ignored.
[3,G] [Avertissement]	Incorrect zone value, value ignored.
[4,G] [Avertissement]	Incorrect zone value, value ignored.
[5,G] [Avertissement]	Incorrect zone value, value ignored.
[6,G] [Avertissement]	Incorrect zone value, value ignored.
[1,D] [Avertissement]	La date de début est vide ou invalide. Valeur par défaut:
[1,E] [Avertissement]	La date de fin est vide ou invalide. Valeur par défaut:
[2,D] [Avertissement]	La date de début est vide ou invalide. Valeur par défaut:
[2,E] [Avertissement]	La date de fin est vide ou invalide. Valeur par défaut:
[3,D] [Avertissement]	La date de début est vide ou invalide. Valeur par défaut:

Après avoir fermé la fenêtre d'import, on constate que les activités ont bien été importées, et que la structure récapitulative correspondant à nos phases a été créée :

Gantt Activités Objets connectés sur plan sélectionné

Nom (ID)

- Mon projet ()
 - Sous-projet par défaut (PM-00001)
 - Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord (1)
 - Phase 2 : 1/4 Giratoire Est (2)
 - Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest (3)
 - Phase 3b : Aménagement du TPC (31)
 - Phase 4 : Chaussée Nord (4)
 - Phase 5 : Chaussée Sud (5)
 - Phase 6 : Pavage final (6)

Filtre Zone

Début Fin 11/12/2020 14

Entre Strict 11/12/2020 14

Nom (PM)	ID (PM)	Début (PM)
▼ Mon projet		17/04/2019 08:00
▼ Sous-projet par défaut	PM-00001	17/04/2019 08:00
► Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord	1	17/04/2019 08:00
► Phase 2 : 1/4 Giratoire Est	2	26/06/2019 08:00
▼ Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest	3	24/07/2019 08:00
Démolition bordures et pavés	2405	26/07/2019 08:00
Installations et signalisation	2433	24/07/2019 08:00
Signalisation	2461	22/08/2019 08:08

Procédure d'import d'activités
